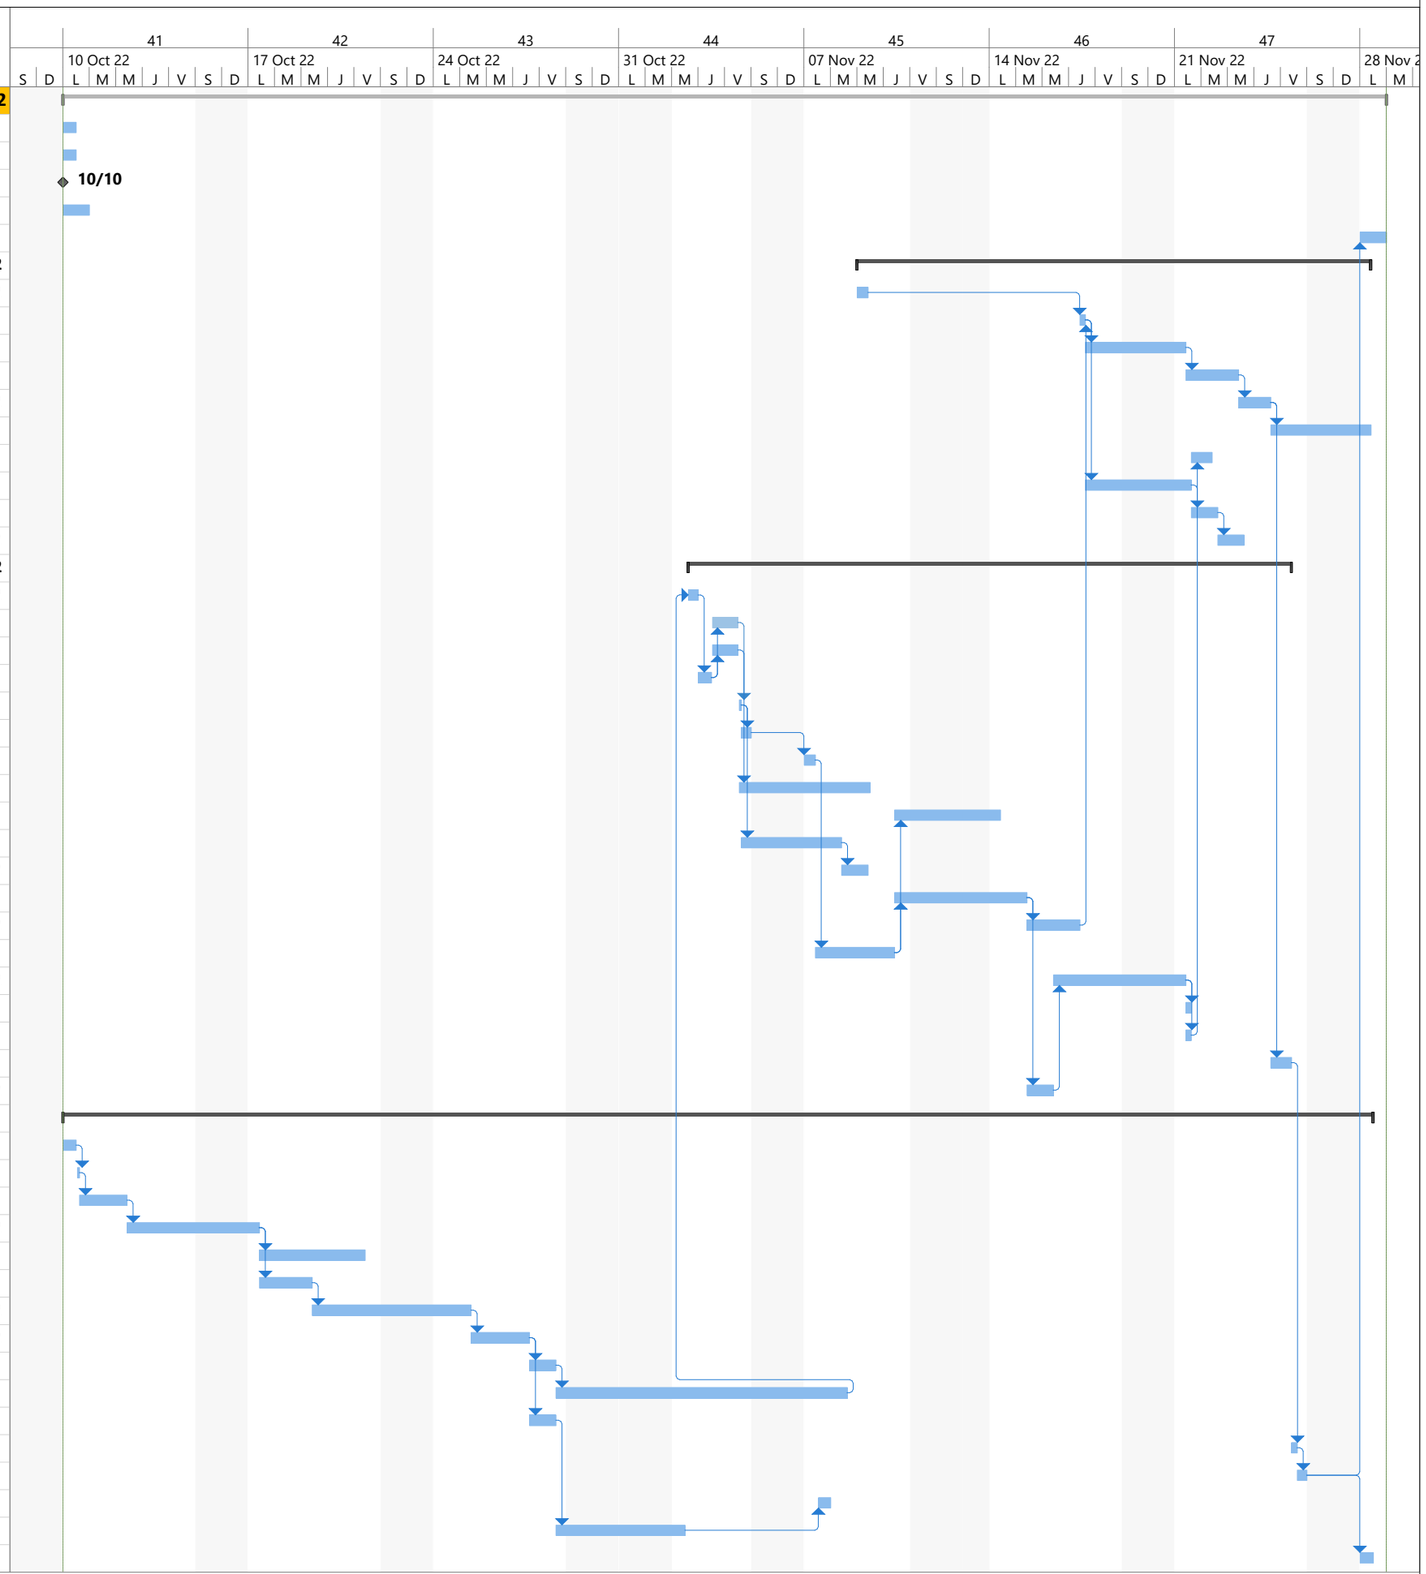N°	Nom de la tâche	Durée	Début
0	**CENTRE BOURG DU BOULAY**	**33 jours**	**Lun 10/10/22**
1	INSTALLATION DE CHANTIER	0.5 jour	Lun 10/10/22
2	CONSTAT HUISSIER	0.5 jour	Lun 10/10/22
3	FRAIS DE CHANTIER	0 jour	Lun 10/10/22
4	REPERAGE DES RESEAUX	1 jour	Lun 10/10/22
5	NETTOYAGE DU CHANTIER	1 jour	Lun 28/11/22
6	**PHASE 1 - CHEMIN RURAL N°7**	**12.25 jours**	**Mer 09/11/22**
7	MISE EN PLACE DE DEVIATION	0.25 jour	Mer 09/11/22
8	DEPOSE DES BORDURES	0.5 jour	Jeu 17/11/22
9	PREPARATION DES BORDURES	1.5 jours	Jeu 17/11/22
10	POSE DES BORDURES	2 jours	Lun 21/11/22
11	GNT CALCAIRE 0/20 SUR PARKING TYPE 5	1.5 jours	Mer 23/11/22
12	POTELETS BOIS	1.5 jours	Jeu 24/11/22
13	GRAVILLONNAGE DU CHEMIN TYPE 6	0.5 jour	Lun 21/11/22
14	TERRASSEMENT + GNT DES ALLES EN STABILISE TYPE 2	2 jours	Jeu 17/11/22
15	STABILISE SUR ALLES ET TROTTOIRS TYPE 2	1 jour	Lun 21/11/22
16	REMISE EN PLACE DES ESPACES VERTS	1 jour	Mar 22/11/22
17	**PHASE 2 - ALLEE DES TILLEULS**	**15.5 jours**	**Mer 02/11/22**
18	SIGNALISATION DE CHANTIER	0.25 jour	Mer 02/11/22
19	ARRASE DE MUR EN 1ML	1 jour	Jeu 03/11/22
20	ARRASE DE MUR A ZERO	1 jour	Jeu 03/11/22
21	DEPOSE DE CLOTURE	0.5 jour	Jeu 03/11/22
22	PREPARATION DES BORDURES	0.25 jour	Ven 04/11/22
23	POSE DES BORDURES	0.25 jour	Ven 04/11/22
24	GNT EN REPROFILAGE SUR PARKING TYPE 5	0.25 jour	Lun 07/11/22
25	TERRASSEMENT - EMPIERREMENT ALLEES TYPE 2 ET TYPE 4	3 jours	Ven 04/11/22
26	STABILISE SUR LES ALLEES TYPE 2	1 jour	Jeu 10/11/22
27	PREPARATION BETON BOUCHARDE TYPE 4	1.5 jours	Ven 04/11/22
28	COULAGE BETON BOUCHARDE TYPE 4	1 jour	Mar 08/11/22
29	GABIONS 2 RANGEES	2 jours	Jeu 10/11/22
30	ESCALIER EN PIERRE	2 jours	Mar 15/11/22
31	TERRAIN DE PETANQUE	3 jours	Lun 07/11/22
32	ESPACE VERT	3 jours	Mer 16/11/22
33	POTELET ACIER ET BOIS	0.5 jour	Lun 21/11/22
34	ALLEE ACCES MAIRIE EN BICOUCHE CLAIR TYPE 7	0.5 jour	Lun 21/11/22
35	ENROBES CLAIR TYPE 3	0.5 jour	Jeu 24/11/22
36	REMISE EN PLACE DES ESPACES VERTS	1 jour	Mar 15/11/22
37	**PHASE 3 - RUE DE L'AGRICULTURE**	**32.5 jours**	**Lun 10/10/22**
38	MISE EN PLACE DEVIATION	0.5 jour	Lun 10/10/22
39	DEPOSE DE LA CLOTURE ET DE LA HAIE	0.25 jour	Lun 10/10/22
40	DEPOSE DES BORDURES	1.5 jours	Lun 10/10/22
41	DEPOSE DES TROTTOIRS	3 jours	Mer 12/10/22
42	TERRASSEMENT - EMPIERREMENT (PARKING TYPE1-VOIRIE TYPE1-TROTTOIRS TYPE 2 ET 4)	4 jours	Lun 17/10/22
43	PREPARATION DES BORDURES	2 jours	Lun 17/10/22
44	POSE DES BORDURES	4 jours	Mer 19/10/22
45	REGLAGE TROTTOIRS ET VOIRIES	2.5 jours	Mar 25/10/22
46	PREPARATION DU BETON BOUCHARDE TYPE 4	1 jour	Jeu 27/10/22
47	COULAGE BETON BOUCHARDE TYPE 4	5 jours	Ven 28/10/22
48	POTELET BOIS ET ACIER	1 jour	Jeu 27/10/22
49	ENROBES CLAIR TYPE 3	0.5 jour	Ven 25/11/22
50	PLATEAU EN ENROBES	0.25 jour	Ven 25/11/22
51	ENROBES DE PARKING BB+GB TYPE 1	0.5 jour	Lun 07/11/22
52	SABLE STABILISE TYPE 2	0.75 jour	Ven 28/10/22
53	DEPOSE DE LA DEVIATION	0.5 jour	Lun 28/11/22
